福建省工业设安装有限公司厦门分公司

施 工 估 料 单

工程名称：50万吨/年重芳烃轻质化装置(含相应区域总图及综合管线)施工(PC)总承包工程　编制日期：2025 年7月10日 编号

序号	物料名称	材质	型号规格	计量单位	数量			分部分项名称	工业标准	需求日期	备注
					投标量	本次估料	已估数量				
1	平垫铁	Q235B	340*100*20	块	0	56	0	塔器/反应器		2025.08.10	详见附件
2	平垫铁	Q235B	320*100*20	块	0	208	0	塔器/反应器		2025.08.10	详见附件
3	平垫铁	Q235B	200*75*29	块	0	56	0	塔器/反应器		2025.08.10	详见附件
4	平垫铁	Q235B	160*65*20	块	0	80	0	容器/换热器		2025.08.10	详见附件
5	平垫铁	Q235B	120*60*20	块	0	294	0	容器/换热器		2025.08.01	详见附件
6	平垫铁	Q235B	120*70*20	块	0	1364	0	机泵/其他设备安装		2025.08.01	详见附件
7	斜垫铁	Q235B	360*80*（7～24）	块	0	112	0	塔器/反应器		2025.08.10	详见附件
8	斜垫铁	Q235B	320*80*（9～24）	块	0	416	0	塔器/反应器		2025.08.10	详见附件
9	斜垫铁	Q235B	220*65*20*（10～20）	块	0	112	0	塔器/反应器		2025.08.10	详见附件
10	斜垫铁	Q235B	170*55*（12～20）	块	0	160	0	容器/换热器		2025.08.10	详见附件
11	斜垫铁	Q235B	130*55*（14～20）	块	0	294	0	容器/换热器		2025.08.01	详见附件
12	斜垫铁	Q235B	120*70*（14～20）	块	0	2728	0	机泵/其他设备安装		2025.08.01	详见附件
13	以下空白										
14											
15											
16											
17											

批准：　　审核:　　编制：

垫铁附件：

塔类设备用垫铁

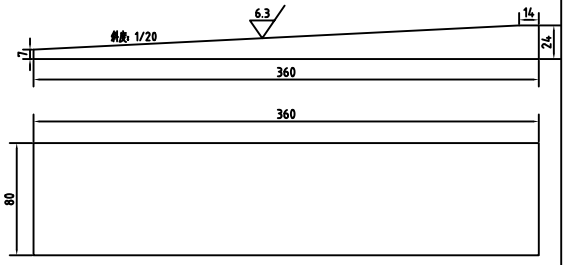

斜垫铁：360×80×24 加工共112块
材质：Q235B

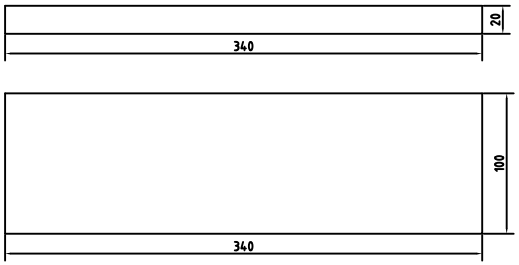

平垫铁：340×100×20 加工共56块
材质：Q235B

塔类设备用垫铁

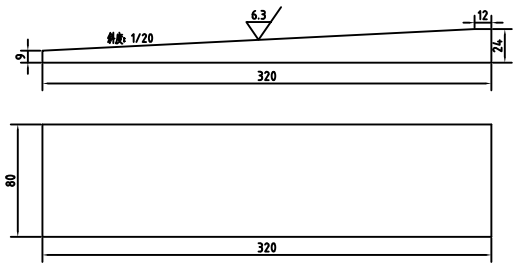

斜垫铁：320×80×24 加工共416块
材质：Q235B

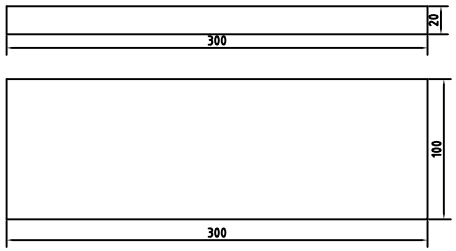

平垫铁：320×100×20 加工共208块
材质：Q235B

塔类设备用垫铁



斜垫铁：220×65×20 加工共112块
材质：Q235B



平垫铁：200×75×20 加工共56块
材质：Q235B

塔类设备用垫铁





斜垫铁：170×55×20 加工共160块
材质：Q235B





平垫铁：160×65×20 加工共80块
材质：Q235B

塔类设备用垫铁





斜垫铁：130×55×20 加工共588块
材质：Q235B



平垫铁：120×65×20 加工共294块
材质：Q235B

泵类（静设备）设备用垫铁





斜垫铁：120×70×20 加工共2728块
材质：Q235B





平垫铁：120×70×20 加工共1364块
材质：Q235B
